



Straßen.NRW

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Ausbau der B480 Raumland - Bad Berleburg Baudurchführung

Stand: 01.06.21

Baudurchführung:

Erfolgt unter Vollsperrung

/ In 3 Bauabschnitten


Bauabschnitt 1:

1. Abschnitt: Limburger Straße bis zum künftigen Kreisverkehrsplatz

- / Umleitung über „Limburgstraße“
- / Für Anlieger „Am Alten Weinberg“ ist der Verkehr frei
- / Betriebe bleiben über die „Limburgstraße“ erreichbar

2. Abschnitt: Kreisverkehrsplatz

Umleitung über L 553 / L 906 „Stöppelsweg“

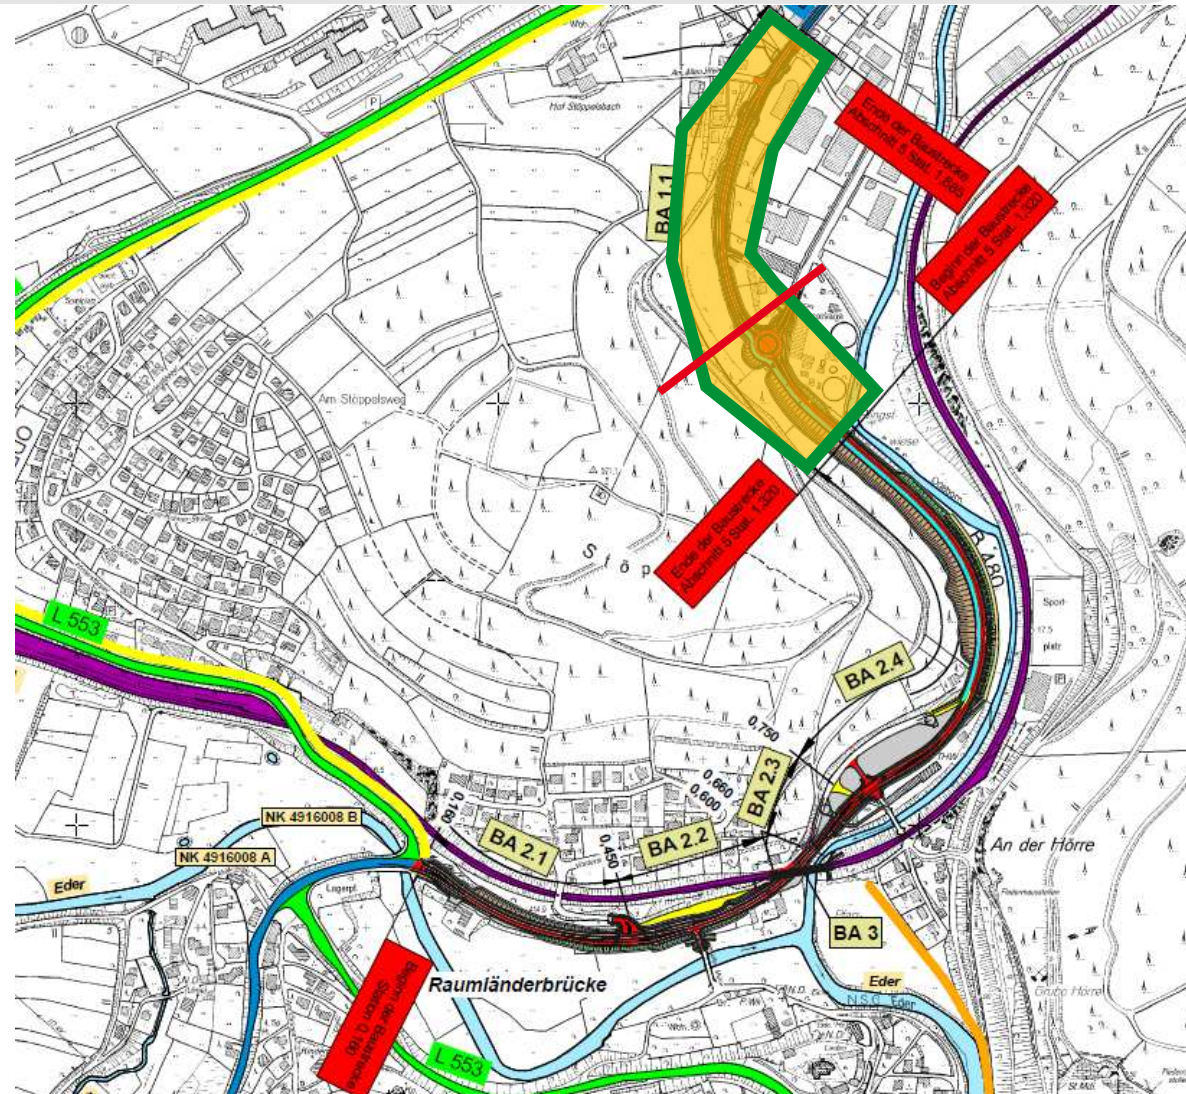

Bauabschnitt 1

unterteilt in
2 Teilabschnitte

Stand: 01.06.21

Baudurchführung:

Erfolgt unter Vollsperrung

/ In 3 Bauabschnitten


Bauabschnitt 2:

/ Unterteilt in Teilabschnitte:

- / BA2.1: Wittgensteiner Straße bis zur Hälfte Einmündung „Am Steinchen“
- / BA2.2 Hälfte Einmündung „Am Steinchen“ bis zur Eisenbahnbrücke
- / BA2.3: Eisenbahnbrücke bis zur Hälfte Einmündung „Pfarrwiese“
- / BA2.4: Hälfte Einmündung „Pfarrwiese“ bis kurz vor neuem Kreisverkehr

Für Anlieger ist der Verkehr frei

/ Einmündung und Grundstückszufahrten bleiben befahrbar

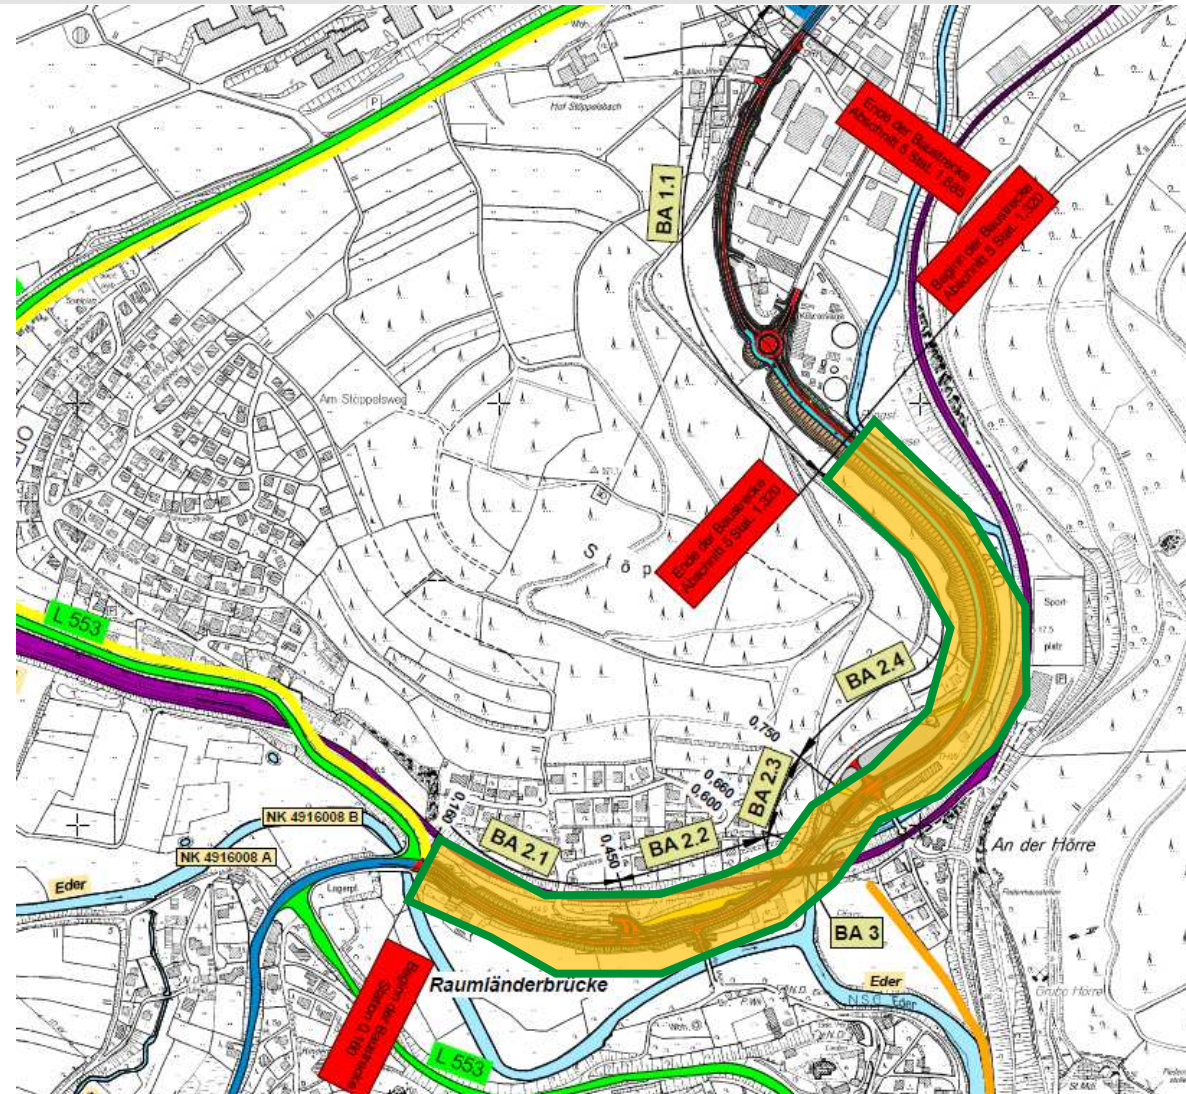

Bauabschnitt 2

Stand: 01.06.21

Baudurchführung:


- / Erfolgt unter Vollsperrung
- / In 3 Bauabschnitten

Bauabschnitt 3:

- / Ersatzneubau der Bahnbrücke

Der Bauabschnitt 3 muss

- / nach dem Teilabschnitt 2.3 und
- / vor dem Teilabschnitt 2.4 gebaut werden.

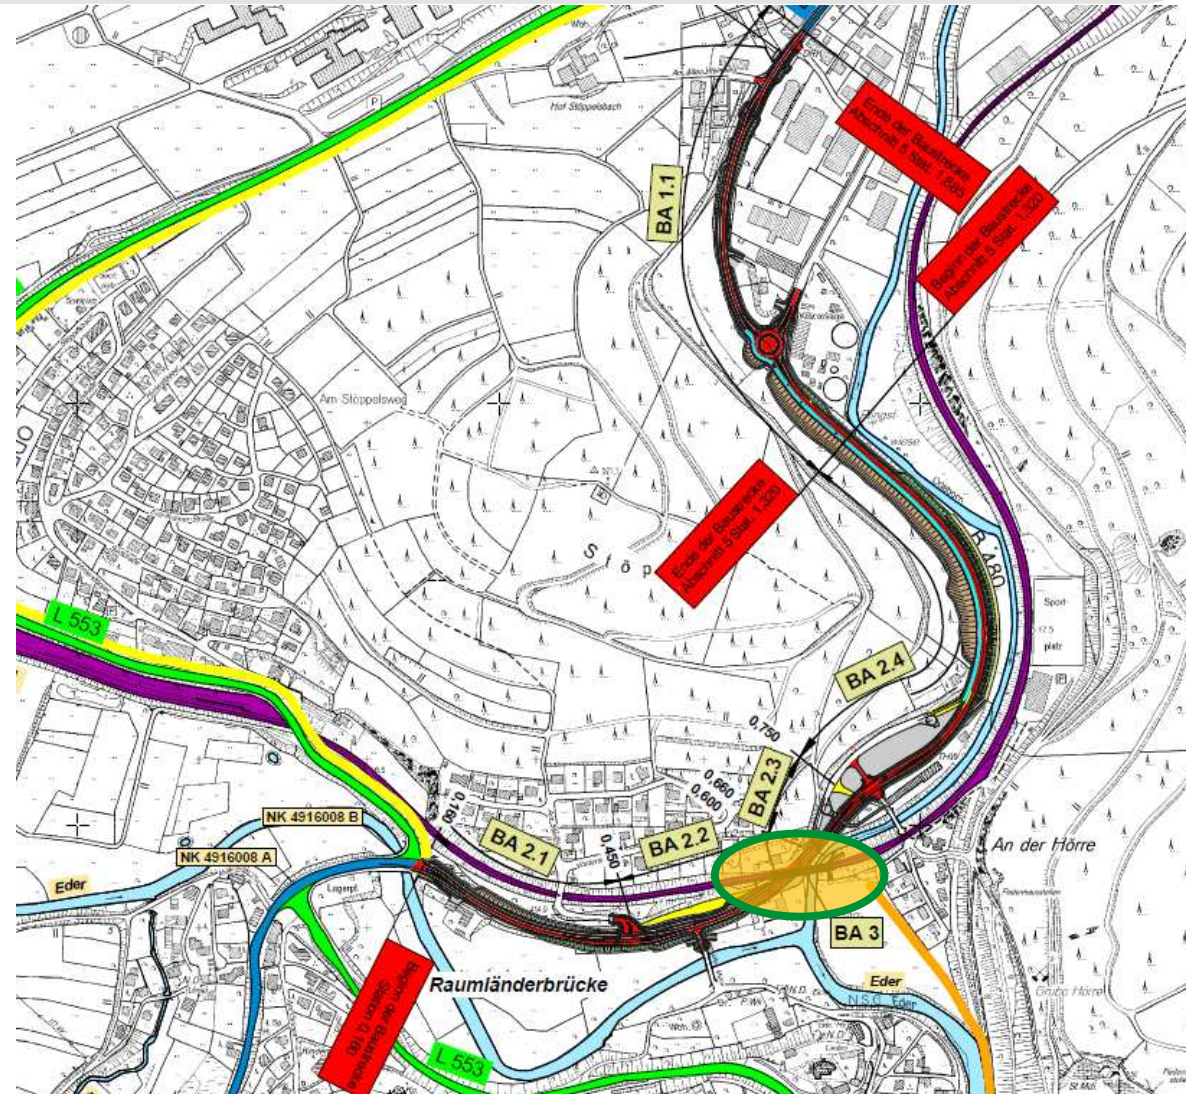

Bauabschnitt 3

Stand: 01.06.21

Umleitungsstrecke:

über die L 906 und die L 555

Bauzeit:

1. Bauabschnitt: ca. 1 Jahr
2. + 3. Bauabschnitt: ca. 2 Jahre

Die erforderlichen Ausgleichs- und Wasserbaumaßnahmen werden im Rahmen der Bauarbeiten der einzelnen Abschnitte mit umgesetzt.

