29.03.2019

H. Fieseler

710664 - Ausbau L740 / B480-OD Küstelberg

Bauzeitenplan

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

WACHENFELD
VERKEHRSWEGEBAU · TIEFBAU
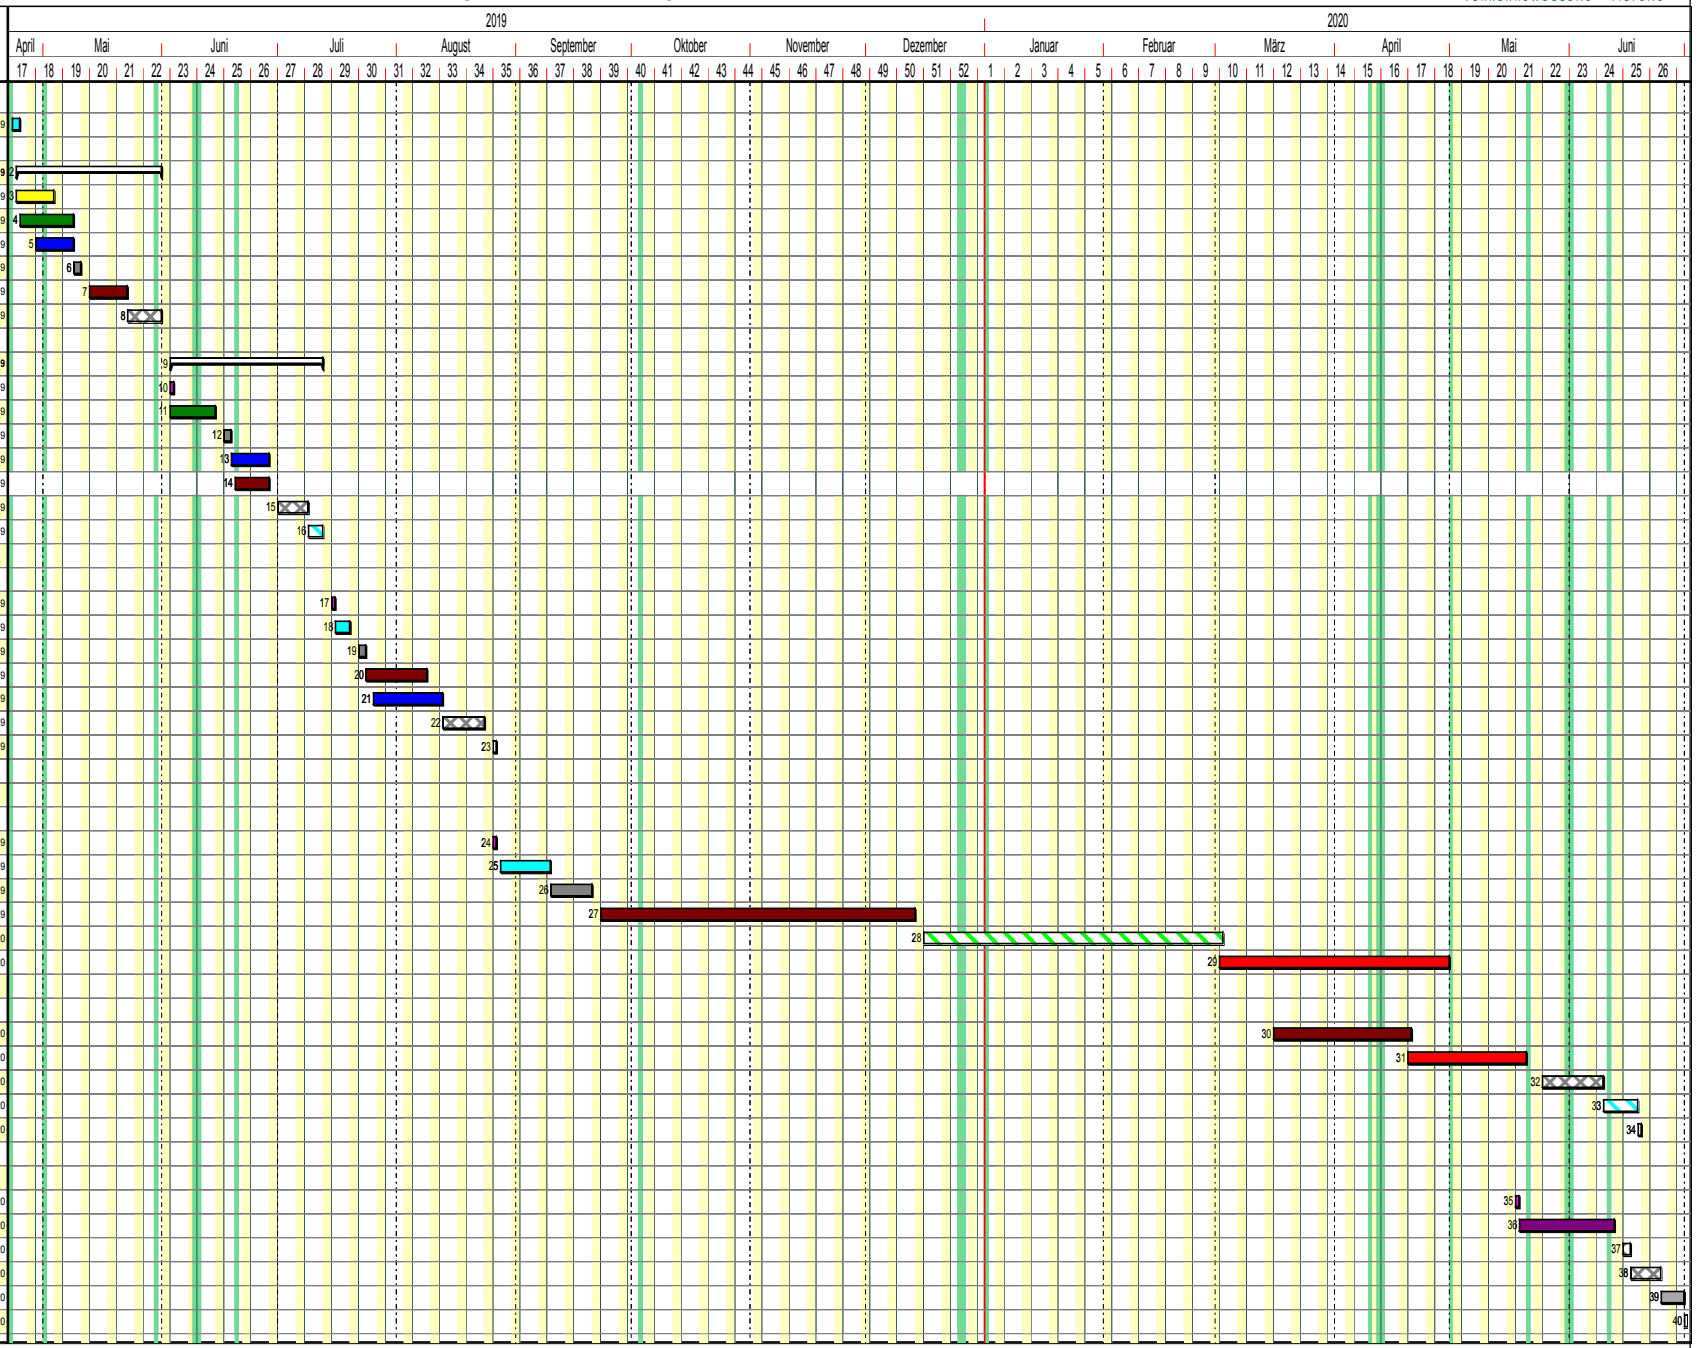
Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
	Allgemeine Arbeiten			
1	Aufbau Verkehrssicherung + Baustelleneinrichtung	23.04.2019	2t	24.04.2019
2	**BA 1.3 - BA 1.4**	**24.04.2019**	**26t**	**31.05.2019**
3	Arbeiten Versorger (Weser-Netz)	24.04.2019	7t	03.05.2019
4	Herstellung prov. Fahrbahnverbreiterung	25.04.2019	9t	08.05.2019
5	Erneuerung Längsdurchlässe	29.04.2019	7t	08.05.2019
6	Asphaltaufbruch	09.05.2019	2t	10.05.2019
7	Erdarbeiten und Einbau Frostschutz	13.05.2019	8t	22.05.2019
8	Asphalteinbau und Herstellung Bankett	23.05.2019	6t	31.05.2019
9	**BA 1.1 - BA 1.2**	**03.06.2019**	**28t**	**12.07.2019**
10	Umbau Verkehrssicherung	03.06.2019	1t	03.06.2019
11	Herstellung prov. Fahrbahnverbreiterung	03.06.2019	9t	14.06.2019
12	Asphaltaufbruch	17.06.2019	2t	18.06.2019
13	Erneuerung Durchlässe	19.06.2019	7t	28.06.2019
14	Erdarbeiten und Einbau Frostschutz	20.06.2019	9t	28.06.2019
15	Asphalteinbau und Herstellung Bankett	01.07.2019	6t	08.07.2019
16	Restarbeiten, Herstellung Mittelnaht und Grabenmulde	09.07.2019	4t	12.07.2019
	BA 2 Vollsperrung (Sommerferien)			
17	Auf- und Umbau Verkehrssicherung	15.07.2019	1t	15.07.2019
18	Rückbau Bestand	16.07.2019	4t	19.07.2019
19	Asphaltaufbruch	22.07.2019	2t	23.07.2019
20	Erdarbeiten und Einbau Frostschutz	24.07.2019	12t	08.08.2019
21	Erneuerung Durchlässe	26.07.2019	12t	12.08.2019
22	Asphalteinbau + Restarbeiten	13.08.2019	9t	23.08.2019
23	Aufhebung Vollsperrung	26.08.2019	1t	26.08.2019
	BA 3 Vollsperrung			
	Abzweig Elkeringhausen nach Abzweig B 480 / Hildfeld			
24	Aufbau Volsperrung	26.08.2019	1t	26.08.2019
25	Rückbau Bestand, Beschilderung, Schutzplanken, usw.	28.08.2019	9t	09.09.2019
26	Asphaltaufbruch	10.09.2019	9t	20.09.2019
27	Erdarbeiten, Drainageleitung, Durchlässe, Stützkonstruktion	23.09.2019	59t	13.12.2019
28	Winterpause	16.12.2019	53t	02.03.2020
29	Einbau Frostschutz + Stützkonstruktionen	02.03.2020	42t	30.04.2020
	BA 3.1 Anschlüsse B 480 / K 49			
30	Erdarbeiten, Verbreiterung, Asphaltaufbruch	16.03.2020	24t	20.04.2020
31	Einbau Frostschutz, Herstellung Planum	20.04.2020	22t	20.05.2020
32	Asphalteinbau Trag- und Deckschicht	25.05.2020	11t	09.06.2020
33	Restarbeiten, Herstellung Bankett und Beschilderung,	10.06.2020	6t	18.06.2020
34	Rückbau Verkehrssicherung	19.06.2020	1t	19.06.2020
	BA 4 OD Küstelberg			
35	Aufbau Verkehrssicherung	18.05.2020	1t	18.05.2020
36	Sanierung Straßenabläufe und Bordanlagen	19.05.2020	16t	12.06.2020
37	Asphaltfräsarbeiten Deckschicht	15.06.2020	2t	16.06.2020
38	Schadstellensanierung Asphalttragschicht	17.06.2020	6t	24.06.2020
39	Einbau Asphaltdeckschicht mit Nebenarbeiten	25.06.2020	4t	30.06.2020
40	Rückbau Verkehrssicherung und Baustellenberäumung	01.07.2020	1t	01.07.2020
